

Einwohnergemeinde Vechigen



Sanierung Wuhlstrasse 3068 Utzigen

2. Informationsanlass vom 2. Februar 2026

Anwohnerinfo vom 25. November 2025

- Interessenabwägung Anwohnende – Landwirtschaftliche Nutzung – effiziente Bauausführung
- Bauablauf, Baustellenorganisation, Etappierung
- Verkehrsführung während der Bauphasen
- Kommunikation und Information während Bauarbeiten
- Private Abwasserentsorgung – Kontaktaufnahme zur Besprechung mit Grundeigentümern

Etappierte Ausführung

Vorarbeiten: Frühling 2026

**1. Etappe: 21. September bis Dezember 2026
(ca. 12 Wochen)**

**2. Etappe: 1. März bis 11. Juni 2027
(ca. 15 Wochen)**

**3. Etappe: 20. September bis Dezember 2027
(ca. 12 Wochen)**

Deckbelag: Sommer 2028

Etappierte Ausführung




Bauzeit total zirka 9 bis 10 Monate

Bauvorgang

- Baustart beim Wohn- und Pflegeheim Utzigen, Bauvorgang von Süd nach Nord
- Grabenaushub (Längen 30 bis 60 m) und Verlegung der Leitungen und Schächte durch **Equipe 1**
Grabenauffüllung, Aushub und Erstellung Fundationskoffer Strasse durch **Equipe 2**
→ **doppelte Baustelleninstallation**
- Versetzen der Randabschlüsse und Einbau der Tragschicht in Etappen mit Länge 120 bis 160 m

Verkehrsführung während Bauarbeiten

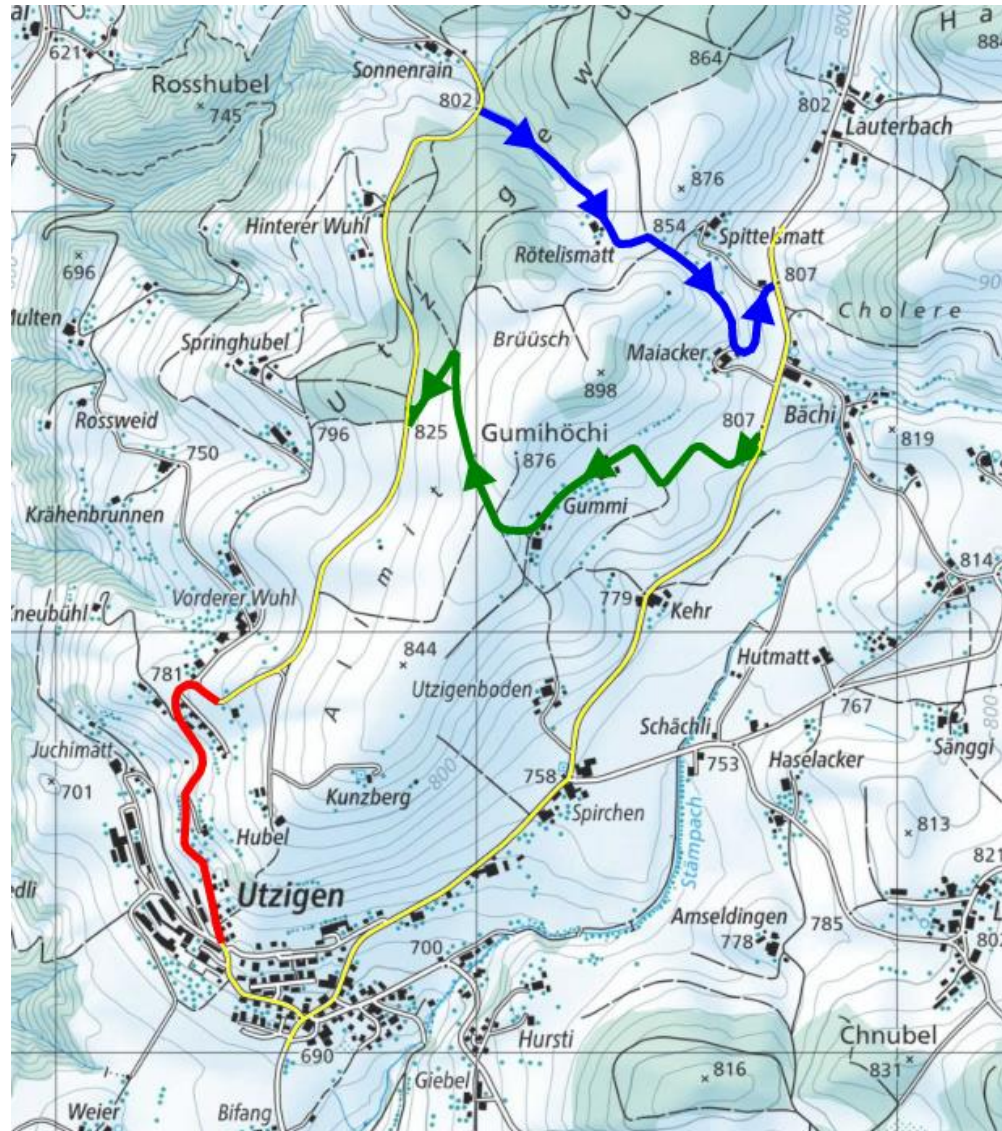

- Perimeter Baustelle
- Umleitung „bergwärts“
- Umleitung „talwärts“
- Bestehende Verbindungsstrassen

Weitere Umleitungen:

- Abschnitt Velolandroute Nr. 899
„Herzschlaufe Burgdorf West“

Kommunikation und Information während Bauarbeiten

- Vor Baubeginn werden Infotafeln aufgestellt
- Vor Baubeginn wird ein Informationsflyer an alle Anwohnende verschickt, u. a. mit Infos betreffend Kehrriichtabfuhr, Schulbus etc.
- Während der Sperren können keine (auch nicht kurzfristige) Durchfahrten gewährt werden
- Regelmässige Info an Anwohnende/Interessierte via Mail (Ausgeführte/Vorgesehene Arbeiten)

Private Abwasserentsorgung - Trennsystem

- Die Massnahmenpläne und Kostenschätzungen wurden durch Infragon Ingenieure AG, Burgdorf zur Verfügung gestellt
- Studium der Leitungsführungen und deren Zustand durch FLM Bauingenieure AG, Worb
- Zusammenstellen von Lösungsvorschlägen, Sanierungs- und Anschlussmöglichkeiten
- Kontaktaufnahme mit den Liegenschaftsbesitzern
 - 1. Etappe bis April 2026
 - 2. Etappe bis September 2026
 - 3. Etappe bis April 2027

Ergänzungen / Anliegen / Fragen
